

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力



公司動態

富華創新




📍 太原總部
📷 陳俊榮 (董事長室)

- 1 8/4 董事長放福利～跑步機嘗鮮中。
- 2 8/6 新部門成立 - 【餐飲事業部】由董事長特助 宗宸宇 親自面試新成員。
- 3 8/7 董事長親自舉辦教育訓練小課堂。

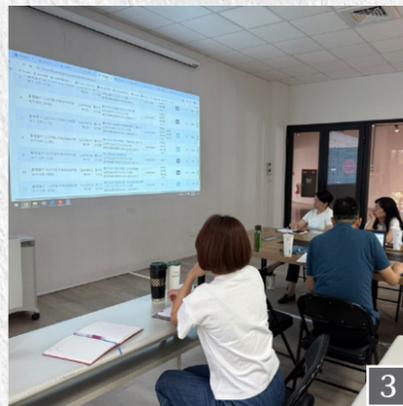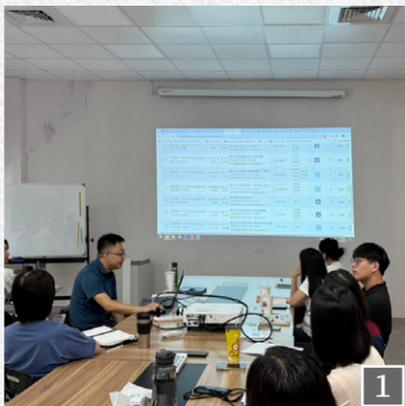

📍 太原總部
📷 吳家羚 (客服部)


- 1 2 3 8/7 透過法拍屋課程，讓同仁對法拍市場有更深層的理解與掌握，收穫滿滿!!

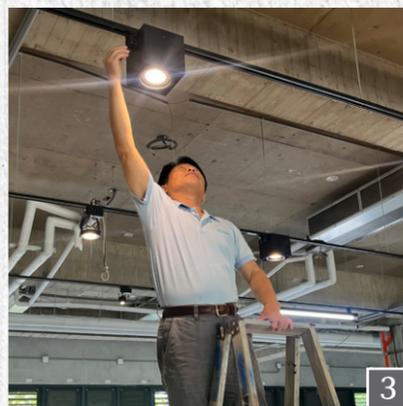

📍 共好 Melody 社區
📷 林珮君 (社服部)

📍 太原總部
📷 黃敏瑄 (社服部)

- 1 7/30 部門人員協助社區勘查逢雨季戶外燈具跳電之原因。
- 2 7/30 部門人員將破口處進行矽利康補強作業，預防雨水滲入，解決電壓不穩之狀況。
- 3 8/6 因應辦公座位區搬遷調整，部門人員細心操作軌道燈具調整與重新定位，展現積極支援內部環境調整工作。配合空間規劃調整，確保照明配置與使用需求一致。

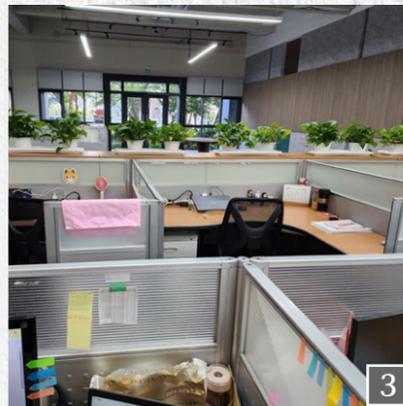

📍 太原總部
📷 劉宇倫 (財務部)




- 1 2 8/7 又接近每個月 10 號固定領現與取款繳費的日子，開始進行會計與出納事務。
- 3 8/7 辦公室風水又起大風吹～這次客服部美麗的姐姐們搬來財務部前方～為忙碌的財務部注入源源活水，能量滿格！

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態




總太營造



📍 太原總部辦公室
👤 張雅宜 (財務部)

- 1 8/7 每月月初個案資金預估表製作。
- 2 3 8/7 月初零用金及各項請款計價單審核計價，這個月多了營造業務部同仁跑標案投標及簡報的差旅費請款，預祝標案順利取得。



富華建設

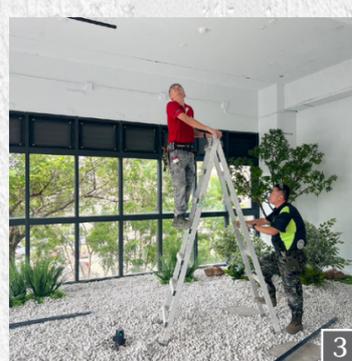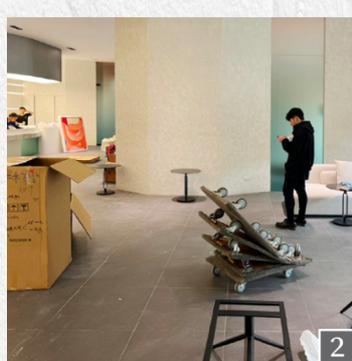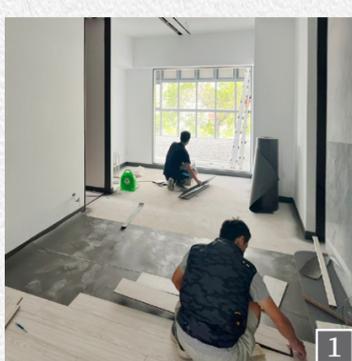

📍 接待中心、2F 樣品屋
👤 樂芸承 (客服部)

- 1 2 3 7/20-8/2 接待中心及樣品屋進入裝潢尾聲，敬請期待！

陞霖建設

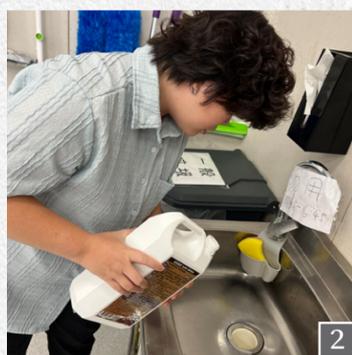




📍 之序工務所
👤 張暉晨 (設計部)

📍 圓觀辦公室
👤 楊欣辰 (行政管理部)

📍 之序接待會館吧台
👤 翁珮文 (禮賓部)

- 1 8/1 工務設計定期會議 (施工界面及樣品討論)。
- 2 8/1 辦公室內水槽管線油污例行清潔作業。
- 3 8/2 研發新餐點製作棉花糖。



日太資產

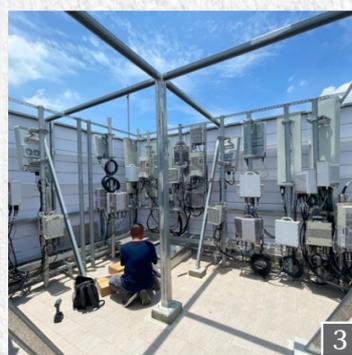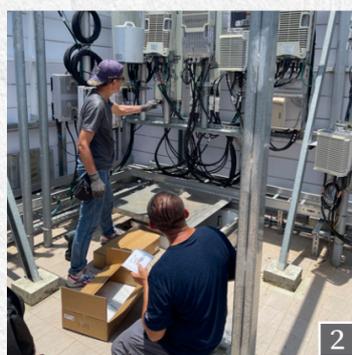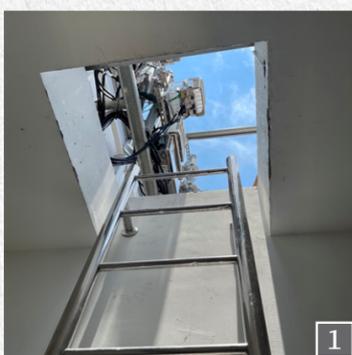

📍 忠孝商場
👤 張冠中

- 1 7/24 忠孝商場頂樓維修孔搭配不鏽鋼圓管製的直立式爬梯，直上直下的使用前往基地臺架設區。
- 2 7/24 忠孝商場頂樓基地臺架設以共構、共站承租給三家電信公司 (中華電信、台哥大、遠傳)。
- 3 7/24 忠孝商場頂樓基地臺設備檢修。

大舜廣告

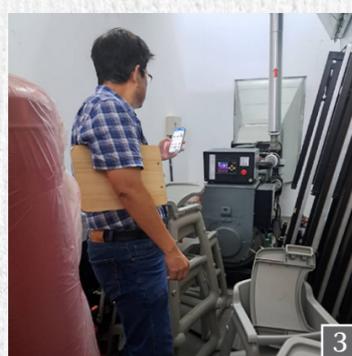

📍 圓觀
👤 侯怡佳 (大舜廣告)


- 1 2 7/27 工作人員於宴會結束之後的清潔，包含到洗手台排水孔清潔和煙灰缸清潔。
- 3 7/30 辦理年度消檢，請社服部_陳清泉協理 協助會同國霖廠商一起完成這項工作。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序

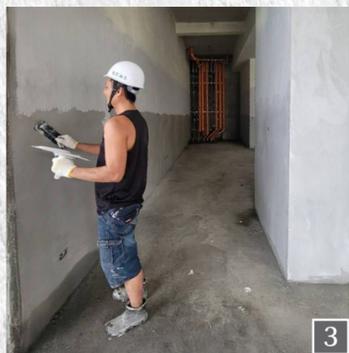

📍 之序建案工地
👤 張友倫




1 8/1 今日進行輕隔間工程施工，畫面中師傅根據骨料位置進行隔間版鎖固，手持電動螺絲起子將隔間板鎖入骨料固定，當層隔間工程施作完成後就可以安排泥作進場打底牆面。

📍 之序建案工地
👤 李煌吉

2 8/5 今日進行熱危害防治宣導，特約職護進場對包商及工務所同仁進行宣導，避免熱危害發生及後續的處理。

3 8/5 今日進行店舖內牆批土作業，畫面中可見師傅手持抹刀及批土盤，進行一度批土作業，先對表面進行初步填充整平，目的是去除凹凸面，後續會再進行二度批土的施作。




總太營造 | 敘 Dos

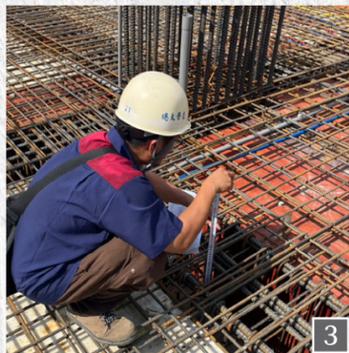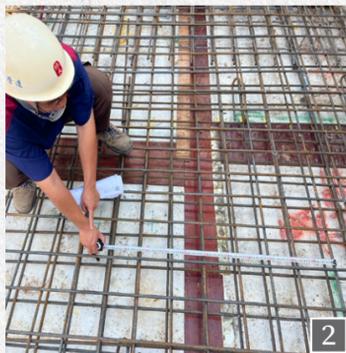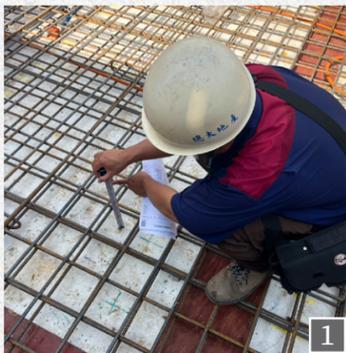

📍 敘 DOS 建案工地
👤 劉昆祐

1 2 3 8/6 今日進行B1FL鋼筋綁紮自主檢查，通過自主檢查，可以及時發現並改正施工中的錯誤和疏漏，確保鋼筋的數量、規格、綁紮方式等符合設計要求，避免偷工減料的情況發生。


總太營造 | 心之所向

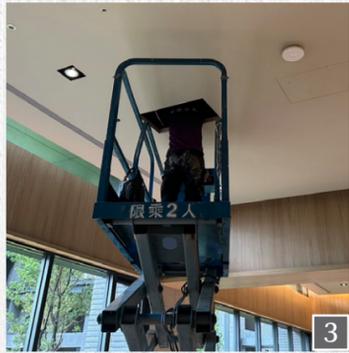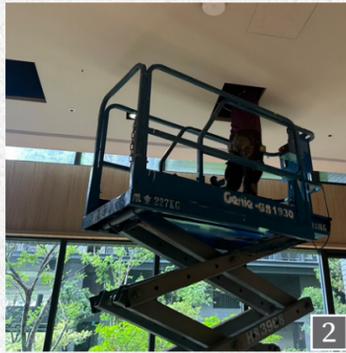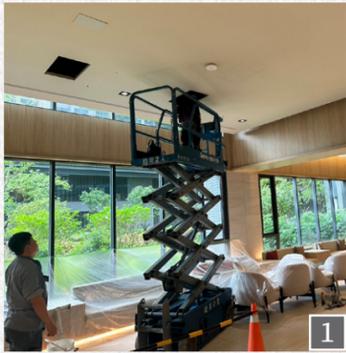

📍 心之所向建案工地
👤 黃佳煌

1 2 3 8/4 心之所向第三方複驗消防管線及設備功能檢查。

總太營造 | 廊子國中

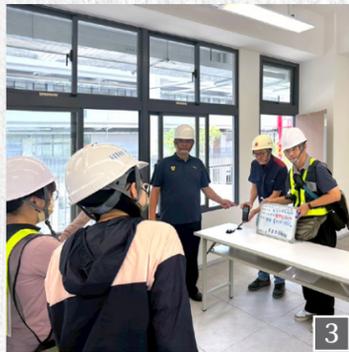

📍 廊子國中
👤 郭暉嶼

1 2 3 8/6 廊子國中賴校長會同教育局承辦、監造、總太團隊，量測教室節能高效平板燈照度，結果皆符合且優於學校使用規範；高效率 LED 燈具的使用不僅達到節能省碳 ESG 精神，也替學校省下黑板間接照明的經費，充份實現價值工程的效益。

總太營造 | 東光好室



📍 東光好室
👤 張世雄

1 8/5 2FL 預留筋綁紮，並使用工作筋固定在放樣位置，防止澆置後位置偏移。

2 8/6 電梯管道坑巡檢，確認工作平台及閘門穩固，並掛掛安全網多一道防護，確保作業人員安全。

3 8/7 2FL 與監造會同查驗，二級品管確保品質。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 松竹好室



📍 松竹好室工地
📷 張世雄

- 1 2 8/4 3FL 柱續接器與監造會同取樣，依取樣頻率施作試驗。
- 3 8/6 專任工程人員巡檢結構體澆置後品質，並指示搗實技巧及不易搗實處增設觀測孔。

總太營造 | 春社安居 B



📍 春社安居 B 工地
📷 江志忠

- 1 8/2 今日上午進行工區動土典禮場地 PC 澆置作業並同步施作抹平。
- 2 8/3 今日下雨，觀察工區動土典禮場地 PC 後排水狀況，現場可見未有積水情形。

📍 春社安居 B 工地
📷 楊千瑤

- 3 8/4 現場動土典禮場地周邊除草後因雨泥濘採用帆布覆蓋以防雨水沖刷。

總太營造 | 永富好室



📍 永富好室工務所
📷 賴建豪

- 1 8/1 與專管（中工分署）、監造廠商及施工廠商進行施工前協調會暨協議組織會議，針對施工及職安管理注意事項說明。

📍 內政部國土管理署 - 中區都市基礎工程分署
📷 賴建豪

- 2 8/5 與專管（中工分署）、監造廠商進行施工前協調會暨危害告知會議，針對施工管理、監造作業及職安管理注意事項說明。

📍 柏斯材料科學檢驗中心
📷 賴建豪

- 3 8/6 與監造廠商、耐震技師，進行混凝土試體抗壓試驗，以確保材料品質。
